Sprint-Planning-Protokoll – Sprint 1

Projekt: LookUpStock **Datum des Plannings:** 27.09.2026
Sprintzeitraum: 28.09.2026 – 04.10.2026 **Sprintlänge:** 1 Woche

Teilnehmer

Name	Rolle	GitHub
Mert Eminel	Product Owner (zugleich Kunde)	KujoBaraka
Carl Stibbe	Scrum Master	carlstibbe
Peter Orban	Entwickler	Pixxels02
Paul Kaufmann	Entwickler	Paul02112004

1. Sprintziel

Ein Nutzer kann Anlagen suchen, daraus ein Portfolio erstellen und für dieses Portfolio eine Monte-Carlo-Simulation durchführen.

2. Ausgewählte User Stories

ID	Issue	User Story	Prio	SP	Story-Verantwortlich
US-02	Docs #8	Als Nutzer möchte ich Anlagen per Ticker, ISIN oder Name suchen, um sie meinem Portfolio hinzuzufügen.	Must	2	Paul02112004
US-03	Docs #1	Als Nutzer möchte ich ein Portfolio aus mehreren Anlagen mit Gewichtungen erstellen, um es simulieren und vergleichen zu können.	Must	5	carlstibbe
US-04	Docs #7	Als Nutzer möchte ich für ein Portfolio Startkapital, Sparrate und Anlagehorizont eingeben und eine Monte-Carlo-Simulation starten, um die Bandbreite möglicher Verläufe zu sehen.	Must	8	Pixxels02
		Summe		**15**	

US-04 ist eine der beiden vorgeschlagenen Kern-Stories (zusammen mit US-07) und wird daher zusätzlich mit Aktivitäts- und Sequenzdiagramm ausgearbeitet.

3. Akzeptanzkriterien

US-02 Anlagen suchen

- Die Suche nach Ticker, ISIN oder Name liefert eine Trefferliste mit Namen, Ticker, Börse und Währung.
- Die Suche startet erst ab zwei eingegebenen Zeichen.
- Bei keinem Treffer erscheint ein Hinweis.
- Fällt die Finanzdaten-API aus, erscheint eine verständliche Fehlermeldung statt eines Absturzes.

US-03 Portfolio erstellen

- Ein Portfolio hat einen Namen und mindestens eine Anlage.
- Die Gewichtungen müssen zusammen 100 % ergeben, sonst ist Speichern nicht möglich.
- Negative Gewichtungen und doppelte Anlagen werden abgelehnt.

US-04 Monte-Carlo-Simulation durchführen

- Startkapital, Sparrate und Anlagehorizont können eingegeben werden; negative oder leere Werte werden abgelehnt.
- Rendite und Volatilität werden aus historischen Kursdaten der Anlagen geschätzt.
- Die Simulation berechnet mindestens 10.000 Pfade.
- Ein Fächerdiagramm zeigt das 5., 50. und 95. Perzentil über den Anlagehorizont.
- Bei gleichem Seed liefert die Simulation identische Ergebnisse.

4. Sprint Backlog

Repositories der Organisation LookUpStock: Docs = Look-Up-Stock-Docs, BE = Look-Up-Stock-BackEnd, FE = Look-Up-Stock-FrontEnd.

Issue	Task	Verantwortlich	Std.
Setup (Docs #11)			
Docs #28	Repository-Struktur und Branching-Strategie festlegen	Paul02112004	1
BE #47	Projektgerüst Backend aufsetzen	Pixxels02	2
FE #6	Projektgerüst Frontend aufsetzen	Pixxels02	2
BE #15	CI-Pipeline Backend mit Build und Test einrichten	Pixxels02	2
FE #5	CI-Pipeline Frontend mit Build und Test einrichten	Pixxels02	2
BE #16	Finanzdaten-APIs testen und auswählen	carlstibbe	2
Docs #29	Server-Setup und Vorbereitung	carlstibbe	2

Issue	Task	Verantwortlich	Std.
Docs #27	Kern-Stories US-04 und US-07 mit dem Dozenten abstimmen	KujoBaraka	0,5
Analyse und Design (Docs #12)			
Docs #14	Kurzformat-Tabellen für US-02, US-03, US-04	KujoBaraka	3
Docs #15	Akteursbeschreibung, Use-Case-Diagramm v1, Glossar	KujoBaraka	2
Docs #16	Erste NFRs nach FURPS+	KujoBaraka	1
Docs #17	Domänenmodell v1	KujoBaraka	2
Docs #18	Wireframes für Suche, Simulation und Portfolio-Editor	carlstibbe	3
Docs #19	Klassendiagramm v1 und ER-Diagramm v1	KujoBaraka	2
Docs #20	ADR-01 Architekturstil, ADR-02 Controller, ADR-03 GRASP-Verantwortungszuweisung	Paul02112004	3
Docs #21	Aktivitätsdiagramm US-04	KujoBaraka	2
Docs #22	Sequenzdiagramm US-04 mit GRASP-Kennzeichnung	KujoBaraka	2
US-02 Anlagen suchen (Docs #8)			
BE #27	Such-Endpunkt mit API-Anbindung	Paul02112004	4
FE #1	Suchfeld mit Trefferliste	KujoBaraka	2
BE #38	Unit-Tests für Suche	Pixxels02	1
US-03 Portfolio erstellen (Docs #1)			
BE #33	Portfolio-Tabellen in Datenbank und Endpunkt	Paul02112004	3
FE #2	Portfolio-Editor mit Gewichtung	carlstibbe	3
BE #32	Unit-Tests für Portfolio	Pixxels02	1
US-04 Monte-Carlo-Simulation (Docs #7)			
BE #39	Kursdaten laden, Rendite und Volatilität schätzen	carlstibbe	3
BE #40	Monte-Carlo-Engine mit festem Seed	Pixxels02	4
BE #41	Unit-Tests Simulationslogik	Pixxels02	2
FE #3	Eingabemaske und Fächerdiagramm im Frontend	carlstibbe	3
Qualität und Doku (Docs #13)			
Docs #23	Testkonzept v1 und Abnahmetestfälle	Paul02112004	2
Docs #24	Testabdeckung in CI messen und interpretieren	Pixxels02	1
Docs #26	Sprint Planning dokumentieren	Paul02112004	1
Docs #25	Sprint Review dokumentieren	Paul02112004	1
	Summe		**64,5**

Der Stand des Sprint Backlogs zum Zeitpunkt des Plannings ist zusätzlich durch Screenshots der GitHub-Projects belegt. Das Project „Docs“ bündelt User Stories und Tasks aller drei Repositories, die Projects „Backend“ und „Frontend“ zeigen die Tasks des jeweiligen Code-Repositories.

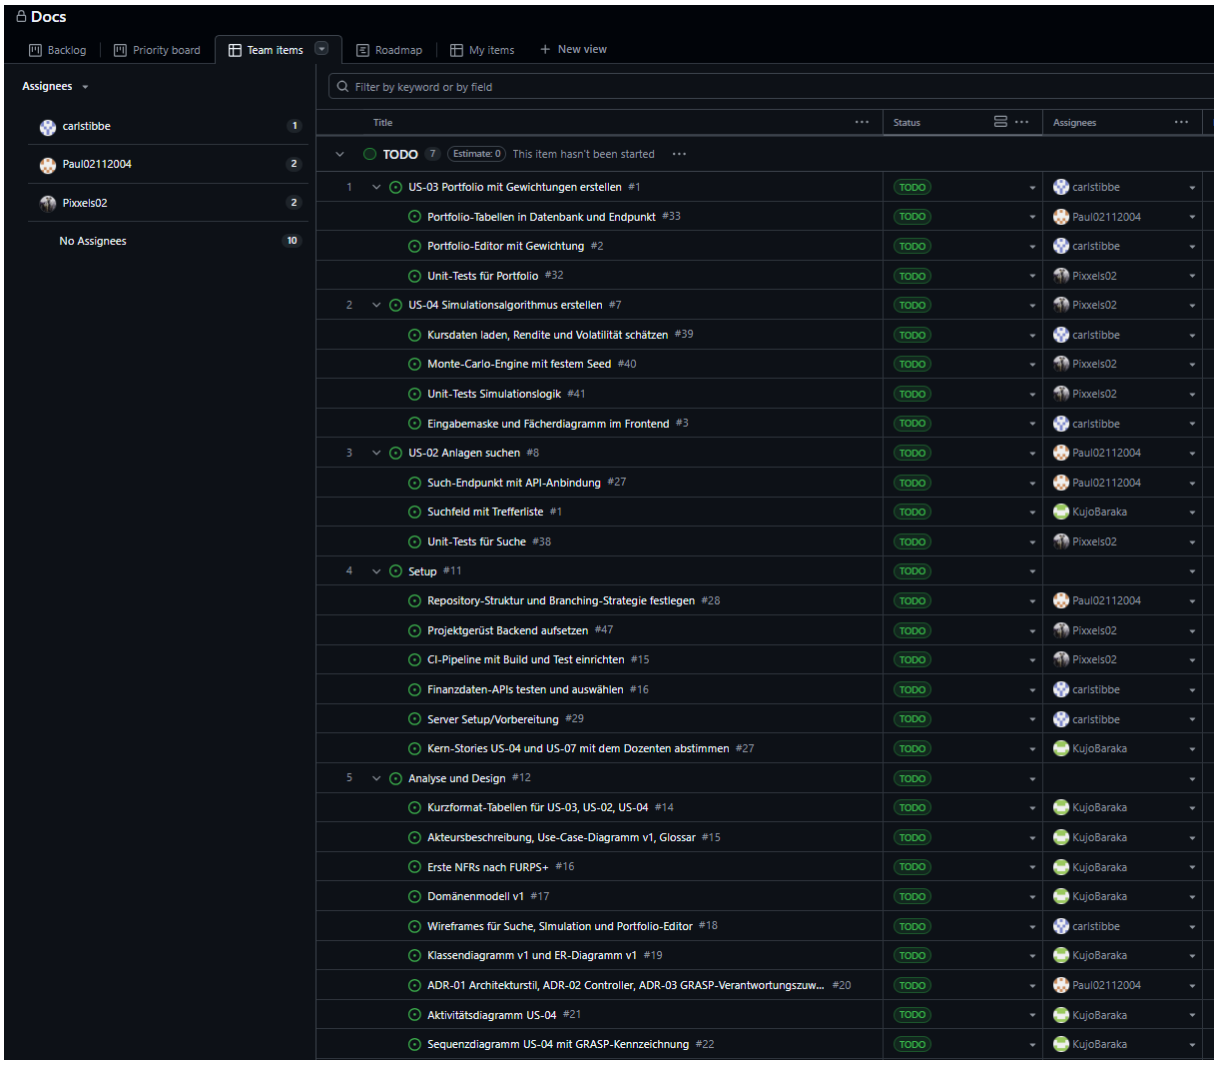


Abbildung 1a: Project „Docs“ zu Beginn von Sprint 1, Teil 1 (Stand 28.09.2026)



Abbildung 1b: Project „Docs“ zu Beginn von Sprint 1, Teil 2

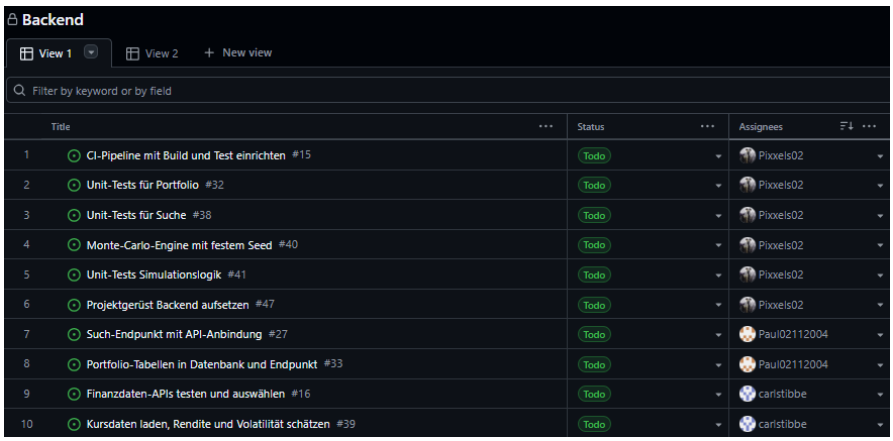


Abbildung 2: Project „Backend“ zu Beginn von Sprint 1

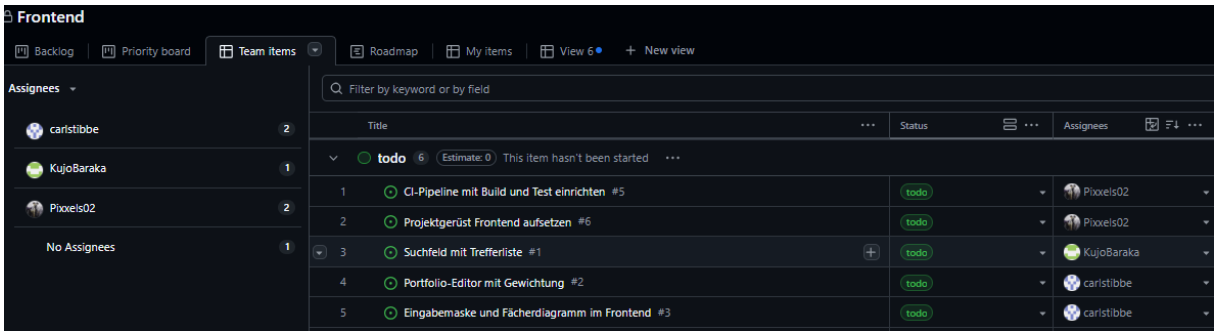


Abbildung 3: Project „Frontend“ zu Beginn von Sprint 1

5. Kapazität und Aufgabenschwerpunkte

GitHub	Schwerpunkt	Verfügbare Std.	Geplante Std.
carlstibbe	Frontend (Wireframes, Portfolio-Editor, Simulationsmaske), API-Auswahl, Kursdaten, Server	16	16
KujoBaraka	Analyse und Modellierung, Suchfeld, Abstimmung mit dem Dozenten (PO)	16,5	16,5
Paul02112004	Backend (Such- und Portfolio-Endpunkte), ADRs, Testkonzept, Sprint-Doku	15	15
Pixxels02	Projektgerüste und CI-Pipelines (Backend und Frontend), Simulations-Engine, Unit-Tests	17	17
Summe		**64,5**	**64,5**

Jedes Teammitglied übernimmt mindestens einen Implementierungs-Task, damit die Commit-Historie die Beiträge aller nachvollziehbar macht. Sprint 1 enthält neben den drei User Stories den einmaligen Setup-Aufwand für Repository, Projektgerüst, CI-Pipeline und Server; die Auslastung ist daher höher als in den folgenden Sprints.

Abhängigkeiten im Sprint:

- BE #47 und FE #6 (Projektgerüste) sowie BE #16 (API-Auswahl) werden zuerst erledigt, da alle Umsetzungs-Tasks darauf aufbauen.
- BE #39 (Kursdaten) und BE #40 (Engine) werden eng abgestimmt, da die Engine die geschätzten Parameter verwendet.
- Docs #21 und Docs #22 (Diagramme US-04) entstehen parallel zur Umsetzung von US-04 und werden mit Docs #20 (ADR-03) abgeglichen.

- Die Such- und Portfolio-Endpunkte (BE #27, BE #33) und die zugehörigen Oberflächen (FE #1, FE #2) werden über eine vorab gemeinsam festgelegte API-Schnittstelle abgestimmt.

6. Definition of Done

Eine User Story gilt als erledigt, wenn

- alle Akzeptanzkriterien erfüllt sind,
- der Code im Repository liegt und von einem zweiten Teammitglied gesichtet wurde,
- die Unit-Tests in der CI-Pipeline erfolgreich laufen,
- die Abnahmetestfälle dokumentiert und bestanden sind,
- die betroffenen Diagramme aktualisiert sind,
- jede KI-Nutzung im KI-Log eingetragen ist.

7. Entscheidungen

Bereich	**Entscheidung**
Frontend	HTML, CSS und JavaScript
Backend	Java Bootstrap
Datenbank	PostgreSQL
Deployment	Eigener Server, Container über Docker Compose
Repository und CI	GitHub-Organisation LookUpStock mit drei Repositories (Look-Up-Stock-BackEnd, Look-Up-Stock-FrontEnd, Look-Up-Stock-Docs); je eine CI-Pipeline für Backend und Frontend mit GitHub Actions
Board	GitHub Projects der Organisation; das Project „Docs“ bündelt User Stories und Tasks aller Repositories, Tasks als Sub-Issues der User Stories, Milestones je Sprint
Diagramm-Tool	Visual Paradigm Online
Finanzdaten-API	wird in BE #16 getestet, Entscheidung bis 04.10.2026

In Sprint 1 werden Portfolios noch ohne Nutzerzuordnung gespeichert; die Zuordnung folgt mit US-01 in Sprint 2.

8. Risiken

Risiko	Gegenmaßnahme
Hoher Umfang durch Simulation und Setup im selben einwöchigen Sprint	Setup-Tasks zuerst erledigen; bei Verzug im Sprint Review begründen und Resttasks in Sprint 2 übernehmen
Die gewählte API deckt europäische ETFs oder die ISIN-Suche nicht ab	API früh testen (BE #16), ISIN bei Bedarf über OpenFIGI auflösen
Strenge Rate Limits der kostenlosen API	Suchergebnisse und Kursdaten cachen
Einarbeitung in den Tech-Stack dauert länger als geplant	Gewählter Stack (Java, HTML/CSS/JavaScript, PostgreSQL) ist mehreren Teammitgliedern bekannt; Einarbeitung früh im Sprint
Server nicht erreichbar oder fällt aus	Mindestens zwei Teammitglieder erhalten Zugriff und können deployen
Frontend und Backend werden in getrennten Repositories entwickelt und passen an der Schnittstelle nicht zusammen	API-Schnittstelle vorab gemeinsam festlegen und im Docs-Repository dokumentieren (z. B. als OpenAPI-Spezifikation)
